




# 거푸집 부재 조립 중 전도·깔림 사고

기대어 둔 거푸집 부재가 넘어지며  
부재 아래 작업자가 깔려 사망.

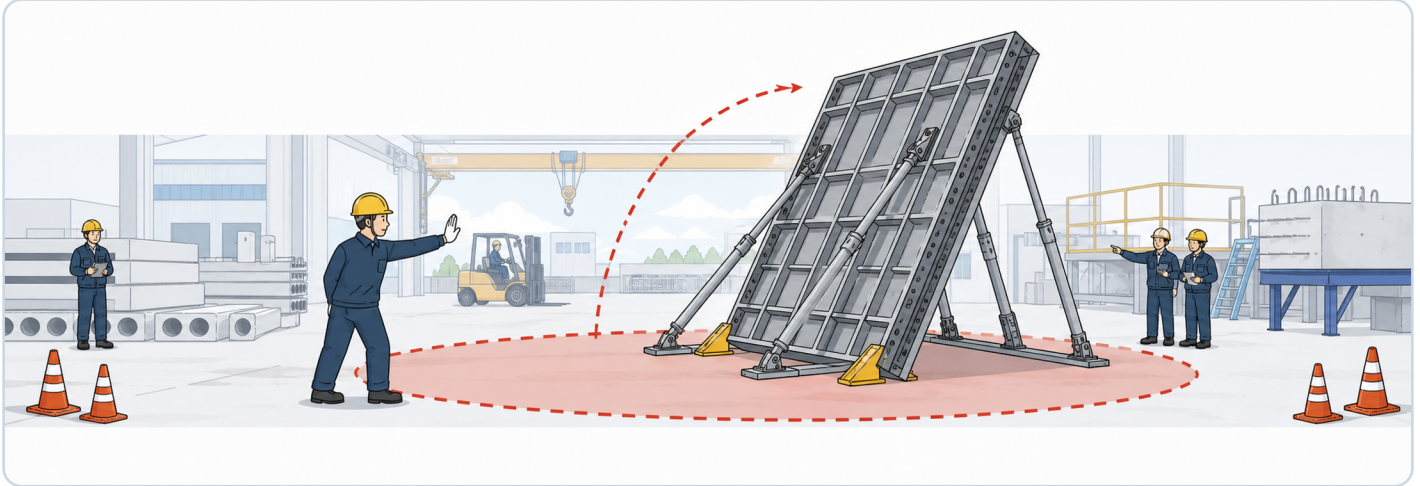

## 사고 경위

|            |                       |             |                             |
|------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|
| <b>언제</b>  | 2026.08.27 16:06      | <b>무엇을</b>  | 기대어 둔 거푸집 부재 아래에서 조립작업      |
| <b>어디서</b> | 충남 천안시 콘크리트 제품 제조 사업장 | <b>어떻게</b>  | 조립 중 거푸집 부재가 넘어져 작업자가 깔려 사망 |
| <b>누가</b>  | 해당 작업 근로자             | <b>확인범위</b> | 중대재해 사이렌 공개 카드              |

## 사고 흐름



### 위험요소

- 1 불안정한 기대기
- 2 전도범위 내 작업
- 3 작업지휘 미확인

### 작업 전 조치사항

- 1 버팀대·고정구 설치
- 2 전도구역 출입통제
- 3 작업계획·지휘자 지정
- 4 안정 확인 후 조립

**부재 아래 들어가기 전 지지·고정을 먼저 확인하세요**
